

窓回りの水切りシート施工です。高さが決められています。

工事名	栄町建売棟新築工事
工種	防水検査写真
撮影日	2020年 2月 13日

水切りシート立上  
150mm以上

桂住宅建設株式会社


透湿防水紙の施工です。軒裏の桁まで施工し、上部は防水テープ処理となります。

工事名	栄町建売棟新築工事
工種	防水検査写真
撮影日	2020年 2月 13日

透湿防水シート  
桁まで張上げ(北面)

桂住宅建設株式会社

換気穴の防水処理です。防水テープでしっかりと処理します。

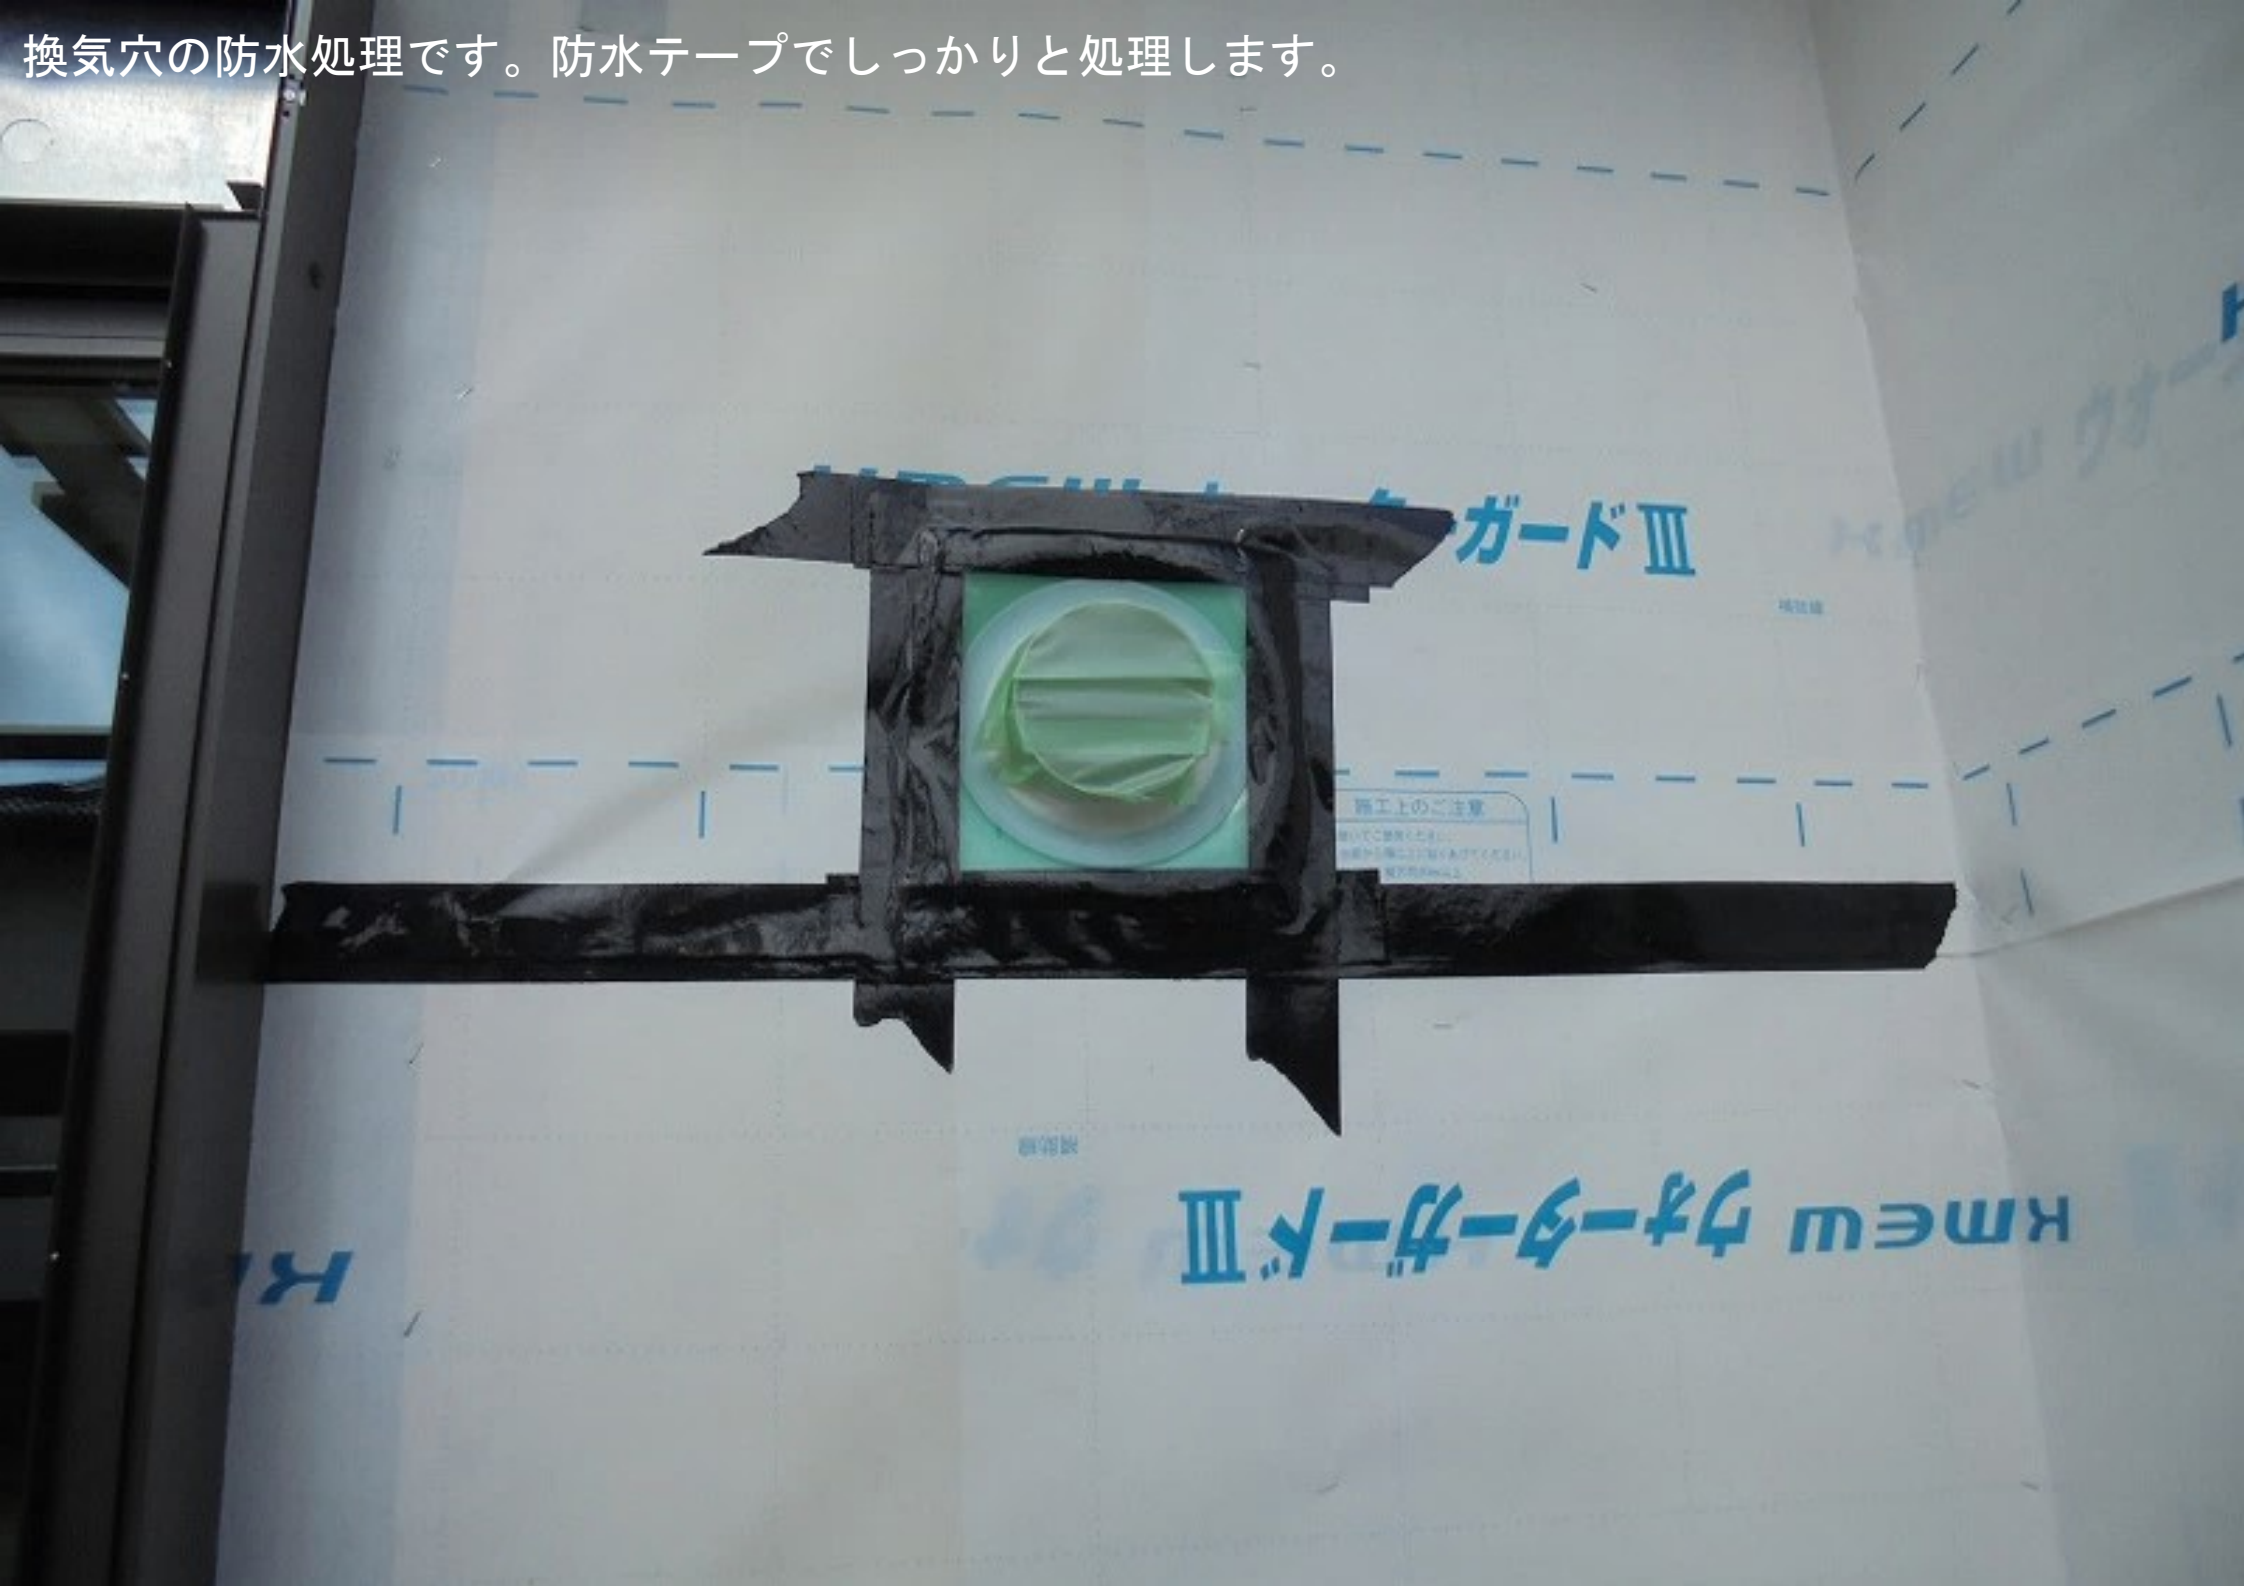

換気菅の勾配の検査です。きちんと外側に傾いています。



バルコニー手摺の下地となる部分の鞍掛け施工です。黒い水切りシートで覆います。

KMEW ウォーターガードⅢ

工事名	栄町建売棟新築工事		
工種	防水検査写真		
撮影日	2020年	2月	13日

鞍掛け施工

桂住宅建設株式会社

バルコニーの窓下の寸法です。120mm以上と決められています。

工事名	栄町建売棟新築工事	
工種	防水検査写真	
撮影日	2020年	2月
		13日
バルコニーFRP 掃出しサッシ下端立上り 120mm以上		
桂住宅建設株式会社		
